| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang |
|---|---|---|---|
| 1 | Kneter | 292 Tage | Di 22.04.08 |
| 6 | Überwachung und Dokumentation | 6 Tage | Fr 05.06.09 |
| 13 | Realisierung Kneter Farrel K 5 | 113 Tage | Mo 08.06.09 |
| 14 | Schienen Zahnradpumpe einlegen | 5 Tage | Mo 08.06.09 |
| 15 | Schienen Temp Ofen 2. OG anzeichnen | 1 Tag | Mo 13.07.09 |
| 16 | Schienen Temp Ofen 2. OG einlegen/untergiessen | 2 Tage | Mo 20.07.09 |
| 17 | Lieferung / Montage Träger zu Oblichter | 1 Tag | Mo 06.07.09 |
| 18 | Montage Oblicht | 2 Tage | Mo 13.07.09 |
| 19 | Stahlbau Betonpodest liefern, einbauen | 5 Tage | Mi 01.07.09 |
| 20 | Betonpodest 1 + 2 erstellen durch Baumeister | 15 Tage | Mi 08.07.09 |
| 21 | Stahlbau, 2 Kleinpodeste einbauen | 2 Tage | Mo 06.07.09 |
| 22 | Stahlbau, 2 Kleinpodeste einbauen (nach erstellen der KS Wand!) | 3 Tage | Mi 29.07.09 |
| 23 | Pasarellen und Leitern einbauen | 5 Tage | Mi 29.07.09 |
| 24 | Kranpodest liefern, einbauen | 6 Tage | Mo 03.08.09 |
| 25 | Schienen Rollerhead, Uth reinigen (Rost entfernen!) | 1 Tag | Fr 07.08.09 |
| 26 | Epoxi Böden EG im Bereich Mischerlinien erstellen | 5 Tage | Mo 10.08.09 |
| 27 | Epoxi Böden 2.OG im Bereich Mischerlinien erstellen | 5 Tage | Mo 10.08.09 |
| 28 | Grosssilo abbauen / Transport / stellen / anpassen | 10 Tage | Mo 10.08.09 |
| 29 | Abnahme Kneter Farrel K5 | 2 Tage | Mi 05.08.09 |
| 30 | Kneter kompl. Liefern / einbringen | 2 Tage | Mo 17.08.09 |
| 31 | Beginn Einbau Kneter | 0 Tage | Mi 19.08.09 |
| 32 | Kneter, Getriebe, etc einbauen | 10 Tage | Mi 19.08.09 |
| 33 | Russstation einbauen | 3 Tage | Mo 24.08.09 |
| 34 | Dosierung liefern / einbringen | 2 Tage | Do 20.08.09 |
| 35 | Bigbag-Dosierung einbauen | 10 Tage | Mo 24.08.09 |
| 36 | Trichter/Waagen/Hirschgew. einbauen | 10 Tage | Mi 02.09.09 |
| 37 | Fixiergestell Leitungen liefern und einbauen | 4 Tage | Mo 07.09.09 |
| 38 | Befestigungen/Halterungen Rohrleitungen liefern | 1 Tag | Fr 11.09.09 |
| 39 | Montage Boden über Betonpodest | 10 Tage | Mo 14.09.09 |
| 40 | Montage Krananlage Bigbag | 10 Tage | Mo 14.09.09 |
| 41 | Leitungen Bigbag > Hirschgew. einbauen | 15 Tage | Mo 14.09.09 |
| 42 | Weichmacherleitungen einbauen | 15 Tage | Mo 14.09.09 |
| 43 | Druckluft anschliessen | 5 Tage | Mo 14.09.09 |
| 44 | Abluft anschliessen | 5 Tage | Mo 14.09.09 |
| 45 | Temperiergeräte liefern | 1 Tag | Di 01.09.09 |
| 46 | Temperierung anschliessen | 3 Tage | Mi 09.09.09 |
| 47 | Elektrisch anschliessen | 5 Tage | Mo 14.09.09 |
| 48 | Elektrische Inbetriebnahme (Handbetrieb) | 3 Tage | Mo 05.10.09 |
| 49 | Steuerung anschliessen | 5 Tage | Do 08.10.09 |
| 50 | Steuerung Inbetriebnahme | 5 Tage | Do 15.10.09 |
| 51 | Dosierung Inbetriebnahme | 5 Tage | Do 22.10.09 |
| 52 | Inbetriebnahme gesamter Kneter | 10 Tage | Do 29.10.09 |
| 53 | Gebäudeöffnung EG (Friedhofseite) schliessen | 0 Tage | Fr 04.09.09 |
| 54 | Einbringrampe OG benützbar ab | 0 Tage | Mo 17.08.09 |
| 55 | Einbringrampe EG (Süd/West) benützbar ab | 0 Tage | Fr 04.09.09 |
| 56 | Anlieferung/Ablad Walzen Tumbelenstrasse 20 | 1 Tag | Do 23.07.09 |
| 57 | Transport Walzen Barzloo und Einbringung | 1 Tag | Mo 24.08.09 |
| 58 | Bodenverankerung | 2 Tage | Di 25.08.09 |
| 59 | Aufbau und Inbetriebnahme | 8 Tage | Mi 26.08.09 |
| 60 | Strom/Ethernet/Tf-Leitung für Walzen | 0 Tage | Fr 21.08.09 |
| 61 | Ablad und Einbringung VMI Batch off | 2 Tage | Do 27.08.09 |
| 62 | Stellen und Bodenverankerungen anbringen | 3 Tage | Mo 31.08.09 |
| 63 | Montage VMI | 5 Tage | Mo 07.09.09 |
| 64 | Strom/Ethernet/Tf-Leitung für VMI | 0 Tage | Fr 21.08.09 |
| 65 | Inbetriebnahme VMI | 5 Tage | Mo 14.09.09 |
| 66 | Anlieferung/Ablad Walzwerk und Zahnradpumpe Uth | 1 Tag | Mo 07.09.09 |
| 67 | Stellen und Verankern | 2 Tage | Di 08.09.09 |
| 68 | Aufbau und Inbetriebnahme | 8 Tage | Do 10.09.09 |
| 69 | Strom/Ethernet/Tf-Leitung für Walzen/Zahnradpumpe | 0 Tage | Fr 21.08.09 |

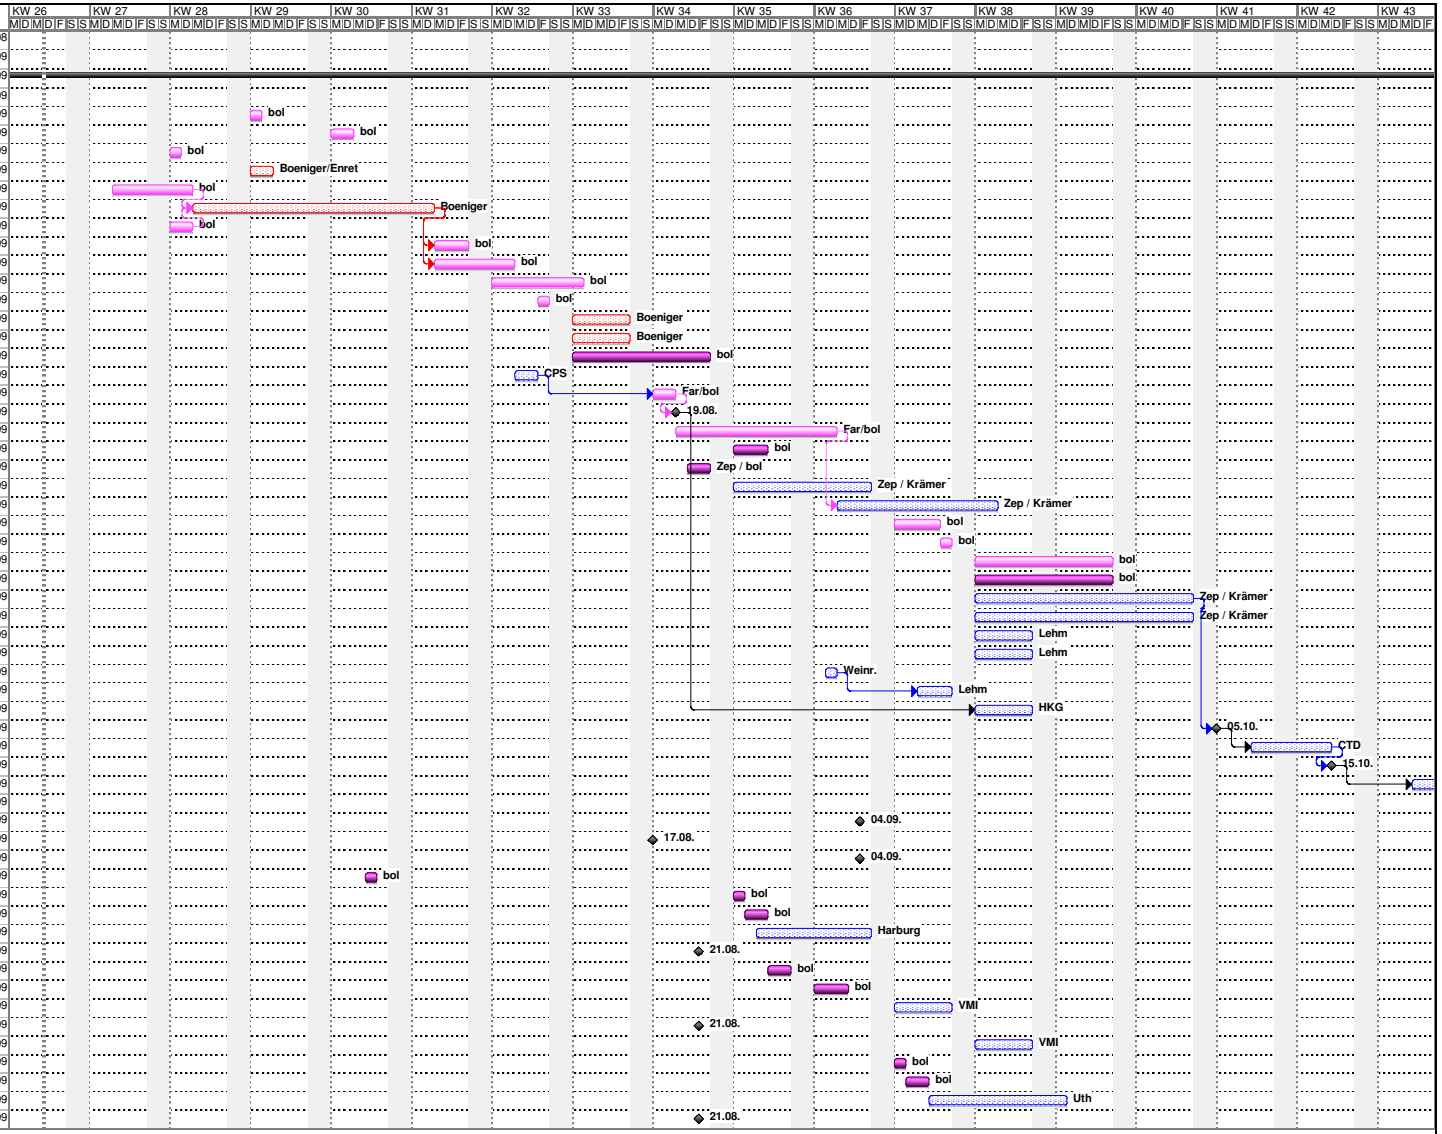


Projekt: Terminplan Kneterlinie 2 ke 1
Datum: Do 25.06.09

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | ExVorgang | In Arbeit
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Unterbrechung
